Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

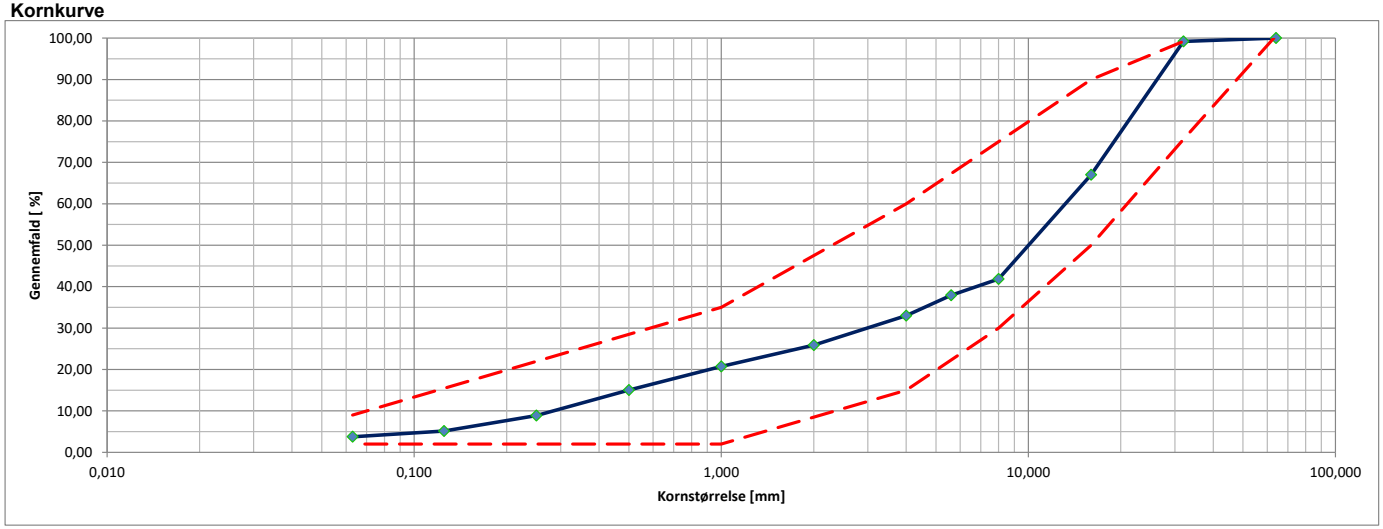

Referenceværdi

Tørrumvægt



Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
63	100		
31,5	99	*75*	*99*
16	67	*50*	*90*
8	42	*30*	*75*
5,6	38		
4	33	*15*	*60*
2	26		
1	21	*2*	*35*
0,5	15		
0,25	9		
0,125	5		
0,063	3,8	*2*	*9*

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	46,5		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg		*max 30*	DS/EN 1097-2
Vandindhold %	7,5		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %		*max 1,2*	prVI 99-3
Knusningsgrad, uknust %		*max 70*	DS/EN 933-5

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte mm	Opnået	Min.	Max.
8 - 16 mm	25	*5*	*35*
4 - 8 mm	9	*5*	*35*

projekt	**Balle Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus
location	Depot
materiale	SG II
udtaget den	19. maj 2026
udført ini.	MMS
kontrol ini.	KG
Sags.nr.	18.003
Internt Sagsnr.	
Prøve nr.	SS 190526

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik
